

СОГЛАСОВАНО:
Р.г.р.В.К. Дзерженко 08.25
Зав.сек. П.С.В.Виник 08.25
Зав.сек. З.А.С.Краско 08.25
Л.Н.В. М.подп. Подпись и дата
Взамен инт.М.

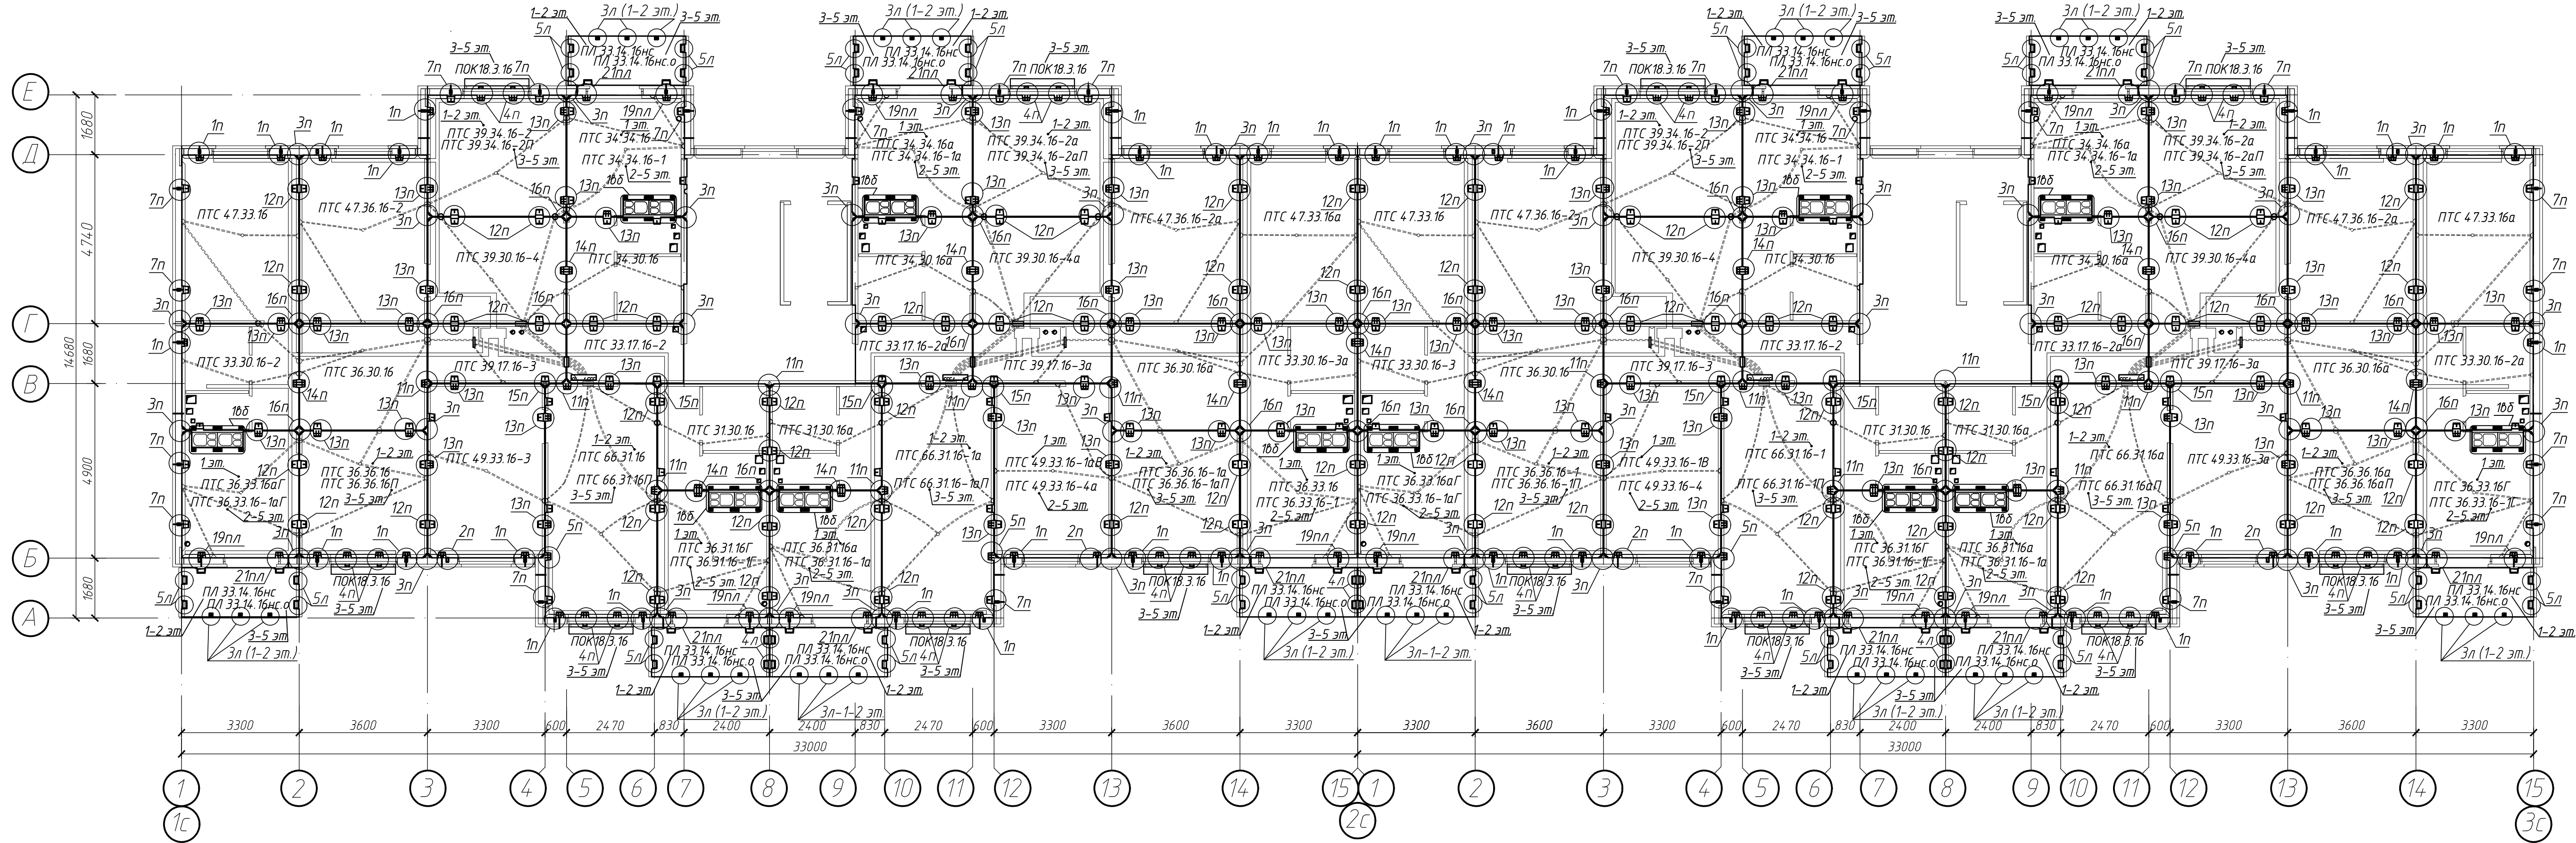


Схема расположения плит входа без электрощитовой

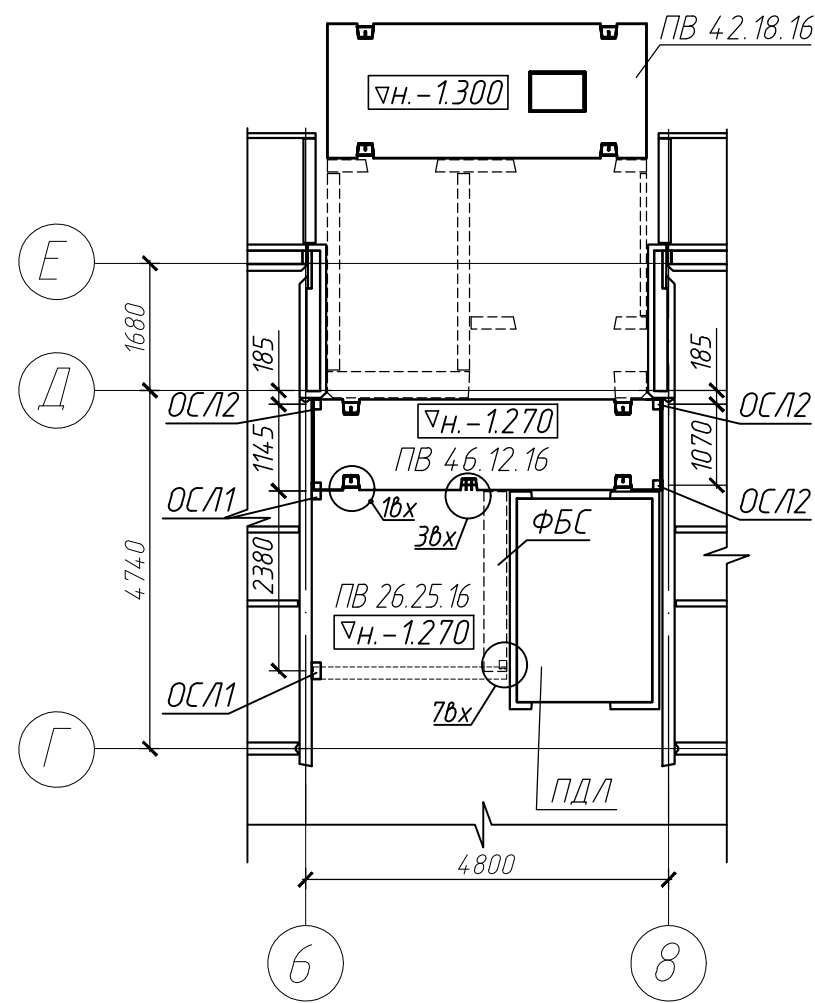


Схема расположения плит покрытия входа без электрощитовой (Фрагмент 1)

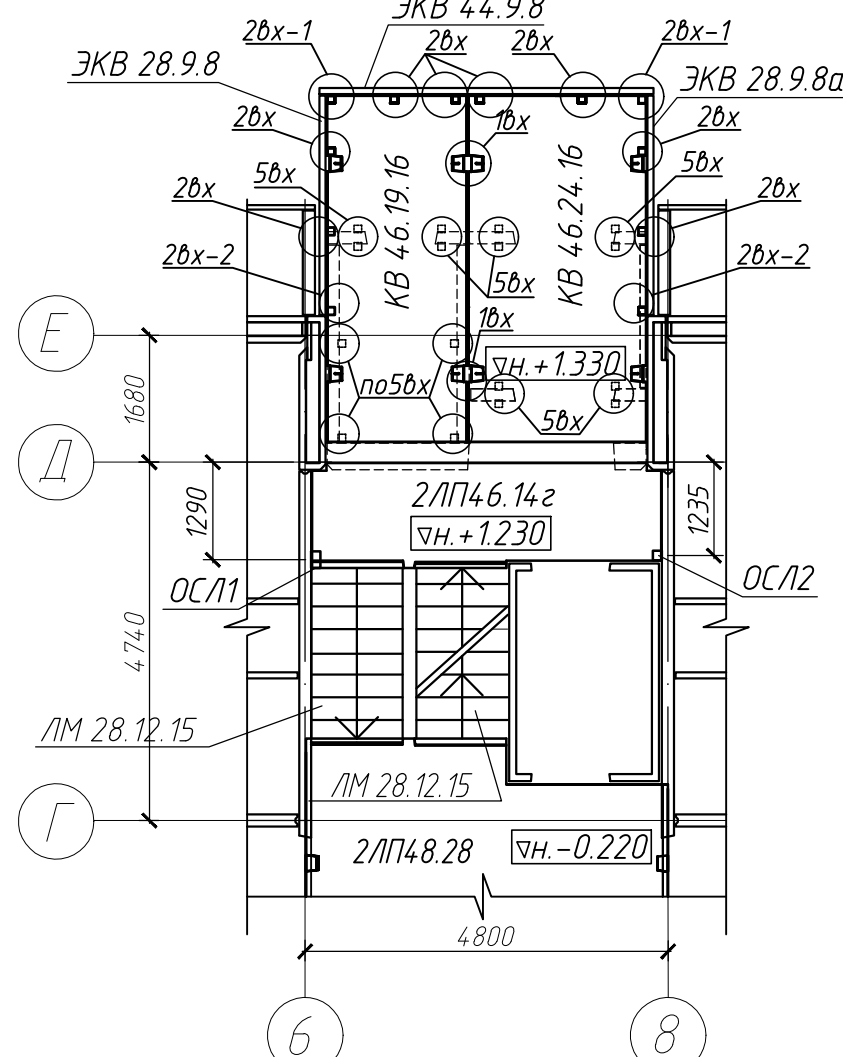


Схема расположения плит покрытия входа с электрощитовой



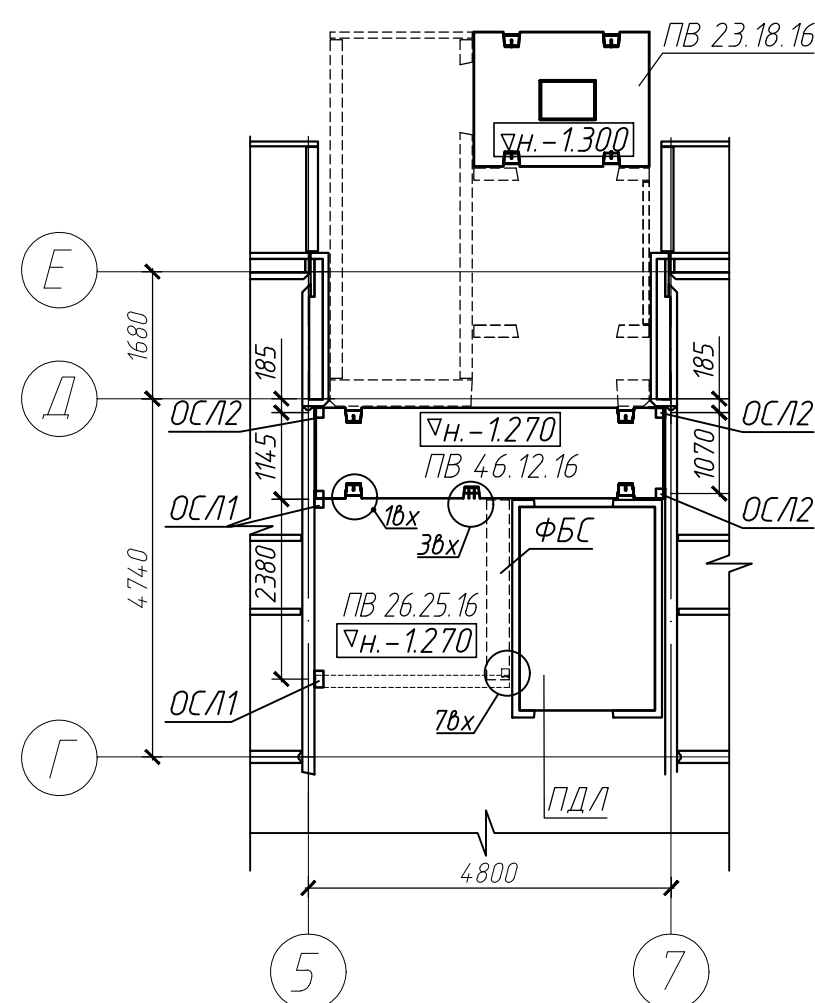


Схема расположения плит покрытия козырьков входа с электрощитовой (Фрагмент 2)

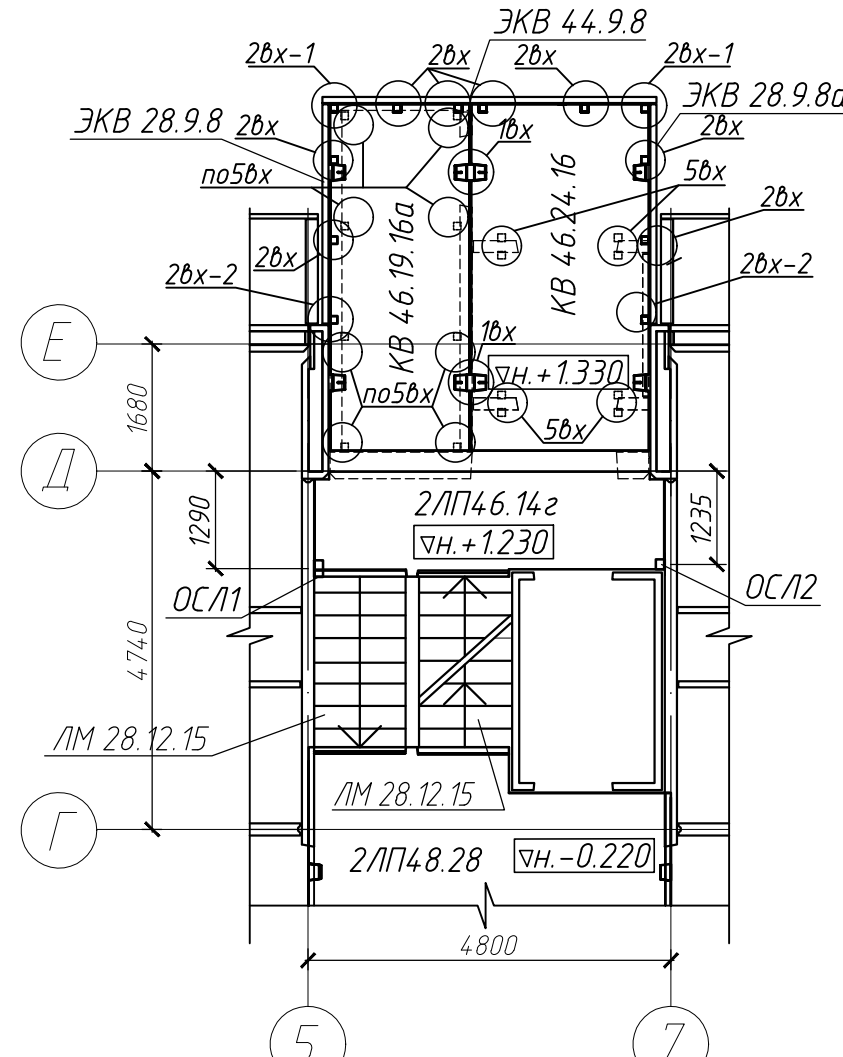

Фрагмент схемы расположения лестничного марша ЛМ 21.12.12 на отм. -1,270

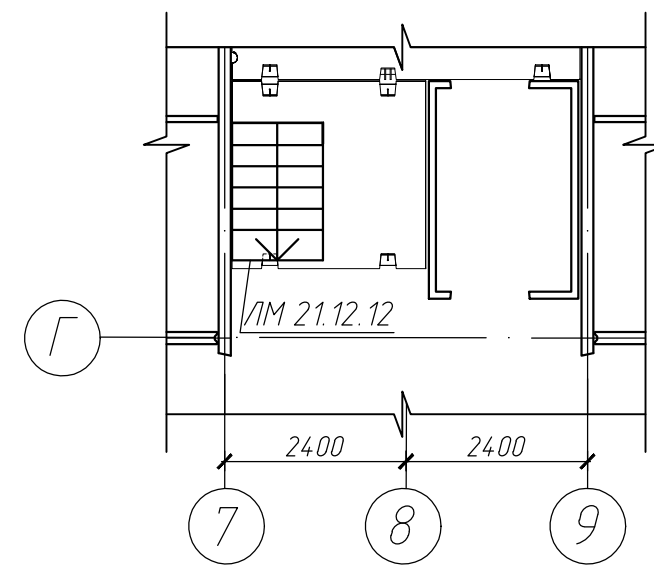

Условные обозначения

- - электроканалы в плитах перекрытия
- - штрабы для труб отопления
- - расположение петель в наружных стеновых панелях

1. Данный лист читать с л. 20, 21, 30;
2. Монтажные узлы см. альбом 90М Новоп-1125 УАС;
3. Плиты перекрытия и покрытия монтировать на свежесложенный слой цементного раствора М200;
4. Заделку швов между плитами перекрытий и покрытий выполнять цементно-песчаным раствором М100 на всю высоту шва с тщательным уплотнением. Швы должны быть очищены от мусора и пыли, а боковые поверхности плит обязательно смочены водой;
5. Стыки между панелями стен и панелями перекрытий, покрытий замоноличиваются после окончания монтажа плит перекрытия;
6. Выполнить цинкнаполненное композитное покрытие на основе лакокрасочных материалов группы IIa, общей толщиной, включая грунтровку - 160 мкм для необетонированных подъемных петель, находящихся в теплоизоляционном слое, панелей ЗНЦ и ЗНС, а также изделия металлические МС, находящихся в теплоизоляционном слое, по узлам 1п, 1п-1, 3п, 4п, 6п, 7п, 8п, 9п, 10п, 18п, 19п, 20пл, 21пл, 22пл альбом 90М Новоп-1125 УАС. Антикоррозионная защита в проекте выполняется при помощи покрытия грунт-эмаль Циол (или аналог).
7. Выполнить заделку отверстий в плитах перекрытия и покрытия по узлам и проходкам труб инженерных коммуникаций 1п-19п, 20пл, 21пл, 3п-7п цементным раствором М200, общий расход - 31,70 м³
8. Выполнить заделку штраб для трубопроводов отопления в плитах перекрытия цементным раствором М200, расход на дом - 18,20 м³.

19.23 АС				
Застройка микрорайона №8А в г.Новополоцке. Возведение жилого дома №869 по генплану				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Посыпкина	08.2025		
Проверил	Терентьев	08.2025		
Н.контроль	Качурина	08.2025		
Утвердил	Тимошечкин	08.2025		
Схема расположения элементов перекрытия 1-5 этажей			Стация	Лист
			С	35
			Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект"	

