Форма С-1

УП «Минскводоканал»

(наименование организации)

Код по ОКУД

**УТВЕРЖДАЮ**
Первый заместитель директора-
главный инженер

_____ А.И.Голоскок
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
«____» _____ 2026г.

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от « 12 » февраля 2026г. № 216 в составе:

председателя комиссии — зам.начальника производства «Минскводопровод» (должность) — Н.И.Сазановой (инициалы, фамилия)

членов комиссии — начальника ТО производства «Минскводопровод» (должность) — М.О.Алексеевич (инициалы, фамилия)

начальника ПТО производства «Минскводопровод (должность) — М.Е.Луцевич (инициалы, фамилия)

начальника района по эксплуатации водопроводных сетей №1 (должность) — Д.В.Апаровича (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:
**«Аварийный ремонт хозяйственно-питьевого водовода, расположенного в районе домов № 55 корп.3 и № 55 корп.4 по ул. Филимонова в г. Минске» (инв. №8661)**
(наименование объекта)

установлено, что участок водовода из железобетонных труб диаметром 1000мм, введенного в эксплуатацию в 1986г.,
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
имеет многочисленные повреждения в результате сверхнормативного износа трубопровода. Для обеспечения надёжности работы насосной станции 2-го подъема «Зеленовка» и гарантированного водоснабжения потребителей необходимо произвести ремонт аварийного участка водовода

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: в зоне производства работ расположены подземные коммуникации
(перечислить фактор)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
в соответствии с технологией производства работ
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Дата начала разработки сметной документации - ноябрь 2026.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ- декабрь 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ - 1 месяц

Председатель комиссии — зам.начальника производства «Минскводопровод» (должность) — подпись — Н.И.Сазанова (инициалы, фамилия)

Члены комиссии — начальник ТО производства «Минскводопровод» (должность) — подпись — М.О.Алексеевич (инициалы, фамилия)

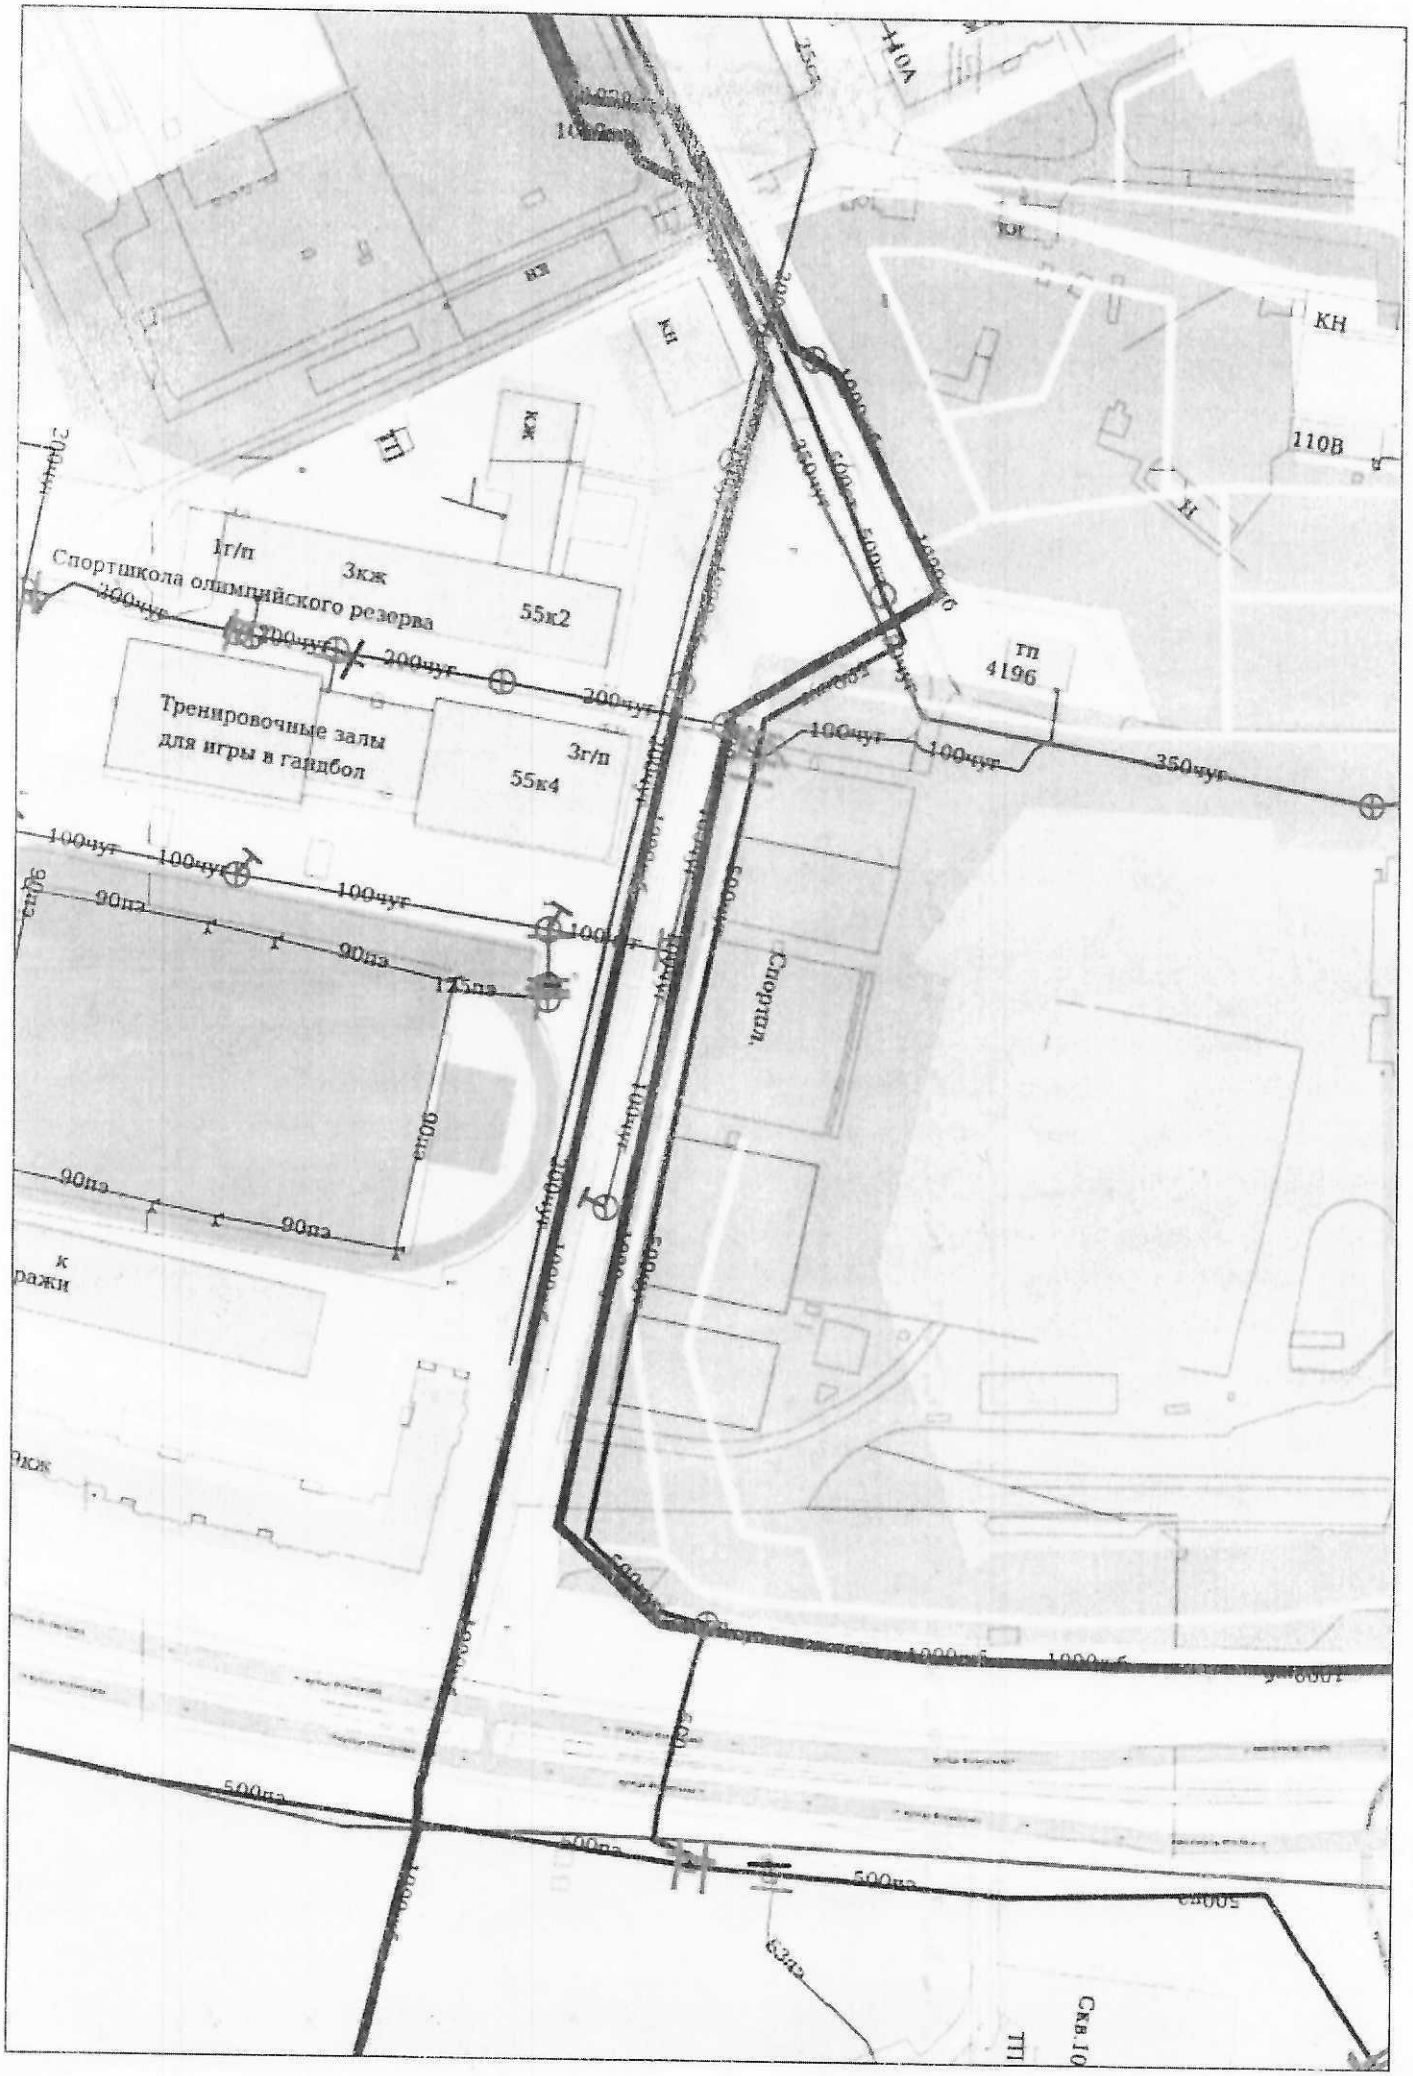
начальник ПТО производства «Минскводопровод» (должность) — подпись — М.Е.Луцевич (инициалы, фамилия)

начальник района по эксплуатации водопроводных сетей №1 (должность) — подпись — Д.В.Апарович (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Санация водовода из ж/б труб Д1000мм полимерным чулком | мп | 250 | ориентировочно |

Составил начальник района по эксплуатации водопроводных сетей №1 _____ Д.В.Апарович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


Спортшкола олимпийского резерва
Тренировочные залы для игры в гандбол
1г/п
3кж
55к2
3г/п
55к4
ТП 4196
КН
110В
300чуг
100чуг
350чуг
90пэ
125пэ
500пэ
Спортив.
